

# खार्पुनाथ गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना.

२०७७ श्रावण



## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



खार्पुनाथ गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको  
कार्यालय  
याङ्चु बजार, हुम्ला



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन  
परियोजना  
खार्पुनाथ गाउँपालिका सहयोग

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश .....	4
नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	4
नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन.....	6
नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	7
नतिजा ४: क्षमता विकास.....	7
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.....	8
१. पृष्ठभूमि.....	8
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	9
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	16
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	18
५. नीति तर्जुमा.....	19
६. सहकार्य.....	19
७. आइपरेका समस्याहरु.....	20
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण .....	21
अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण .....	24
अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था.....	25
अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था .....	25
अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु.....	26
अनुसूची ४: भिजिविलिटी.....	29
अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....	30

## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	खार्पुनाथ गाउँपालिका
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावन २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 <sup>th</sup> July 2019 to 16 <sup>th</sup> July 2020)

### क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च%
यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा)(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत:	६२५१३	४११४५	३८७३७	६२%
	कार्यक्रम/ चालु:	१२५०४	१२४७१	१०५७२	८५%
	<b>जम्मा:</b>	<b>७५०१७</b>	<b>५३६१६</b>	<b>४९३०९</b>	<b>६६%</b>
स्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च%
	स्थानीय तह	१०८३४	७२१४	७२१४	६७%
	नेपाल सरकार	५३८३	५३८३	५३८३	१००%
	दातृ निकाय (GoF / EU)	५८८००	४१०१९	३६७१२	६२%
	<b>जम्मा (WRDF):</b>	<b>७५०१७</b>	<b>५३६१६</b>	<b>४९३०९</b>	<b>६६%</b>
	उपभोक्ताको(Cash)	३२७१	११८३	११८३	३६%
	उपभोक्ताको(Kind)	२१४०९	१४६९०	१४६९०	६९%
	<b>जम्मा (उपभोक्ता):</b>	<b>२४६८०</b>	<b>१५८७३</b>	<b>१५८७३</b>	<b>६४%</b>
	<b>कुल जम्मा:</b>	<b>९९६९७</b>	<b>६९४८९</b>	<b>६५१८२</b>	<b>६५%</b>



## ख. भौतिक प्रगति सारांश

### नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
<b>संरचनाहरू (Schemes):</b>			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	८	८	२४
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)		६	
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	१९६३	१९६३	५०६१
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	९	९	१२
संस्थागत शौचालय (IPO)		१	
<b>सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:</b>			
हातधुने स्थान (घर संख्या)	०	०	०
चांग (घर संख्या)	१८०	१८०	१८०
अन्य (घर संख्या)	०	०	०
<b>अन्य सूचकांकहरू:</b>			
घरभेट			
प्रथम पटक	१७५	१७५	८००
दोस्रो पटक	१२५	१२५	६००
तेस्रो पटक	८०	८०	५००
चौथो पटक	६०	६०	४००
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानीआयोजना घोषणा	०	०	०
खानेपानीआयोजनाअन्तर्गतकोपूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	२९२	२९२	२९२
<b>School WASH (3 – Star model)</b>			
१ – तारापुगेकोविद्यालयसंख्या	०	०	०
२ – तारापुगेकोविद्यालयसंख्या	०	०	०
३ – तारापुगेकोविद्यालयसंख्या	०	०	०
<b>तालिम, गोष्ठीतथा अभियानहरू:</b>			
खानेपानी, पानी गुणस्तरतथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठीतथा	५९१	५९१	१२८०

खार्पुनाथ गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

अभियानहरु			
खानेपानी, पानी गुणस्तरतथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठीतथा अभियानहरु	२३०	२३०	६१८

## नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	०	०	५
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)		४	
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	०	०	११८०
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		१४३१	
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	१	१	८
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)		०	
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	९५	९५	२८६०
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		०	
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	०	०	०
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)			
<b>आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):</b>			
घरवारी सम्बन्धितालिमसंख्या (नयाँ)	१५	१५	६०
घरवारी सम्बन्धितालिमसंख्या (पुनर्ताजगी)	०	०	०
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	३७२	३७२	१५९०
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	२२३२	२२३२	९५४०
<b>Advanced Livelihood</b>			
प्राविधिक(Agro-vet, VMW,MPN,LF, LRP, etc.) तालिम संख्या	१	१	३
प्राविधिक(Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या	३	३	१५
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायको संख्या	१	१	४
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	१०	१०	४०
<b>गोष्ठी तथा अभियानहरू:</b>			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	१	१	४
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	१	१	२
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरूमा सहभागी संख्या	१६	१६	३८

जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठीतथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	३२	३२	६०
---	----	----	----

### नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो(ICS) निर्माण संख्या	२	२	६
सुधारिएको चुल्हो(ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	११५४	११५४	४४३२
सुधारिएकोपानीघट्ट (IWM) निर्माण संख्या	०	०	७
सुधारिएकोपानी घट्ट (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या	०	०	२७६५
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु	०	०	०
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	०	०	०
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	०	०	०

### नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धिक्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

- खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाका उपभोक्ता समितिहरुलाई चरणबद्ध तालिमहरु संचालन
- घरवारी व्यवस्थापन ८ समुहका ३७२ सदस्यहरुलाई घरवारी सम्बन्धि तालिमहरु संचालन
- महिला जना प्रतिनिधि र उपभोक्ता समिति महिला शिक्षकहरुलाई ३ दिने निर्णयमा महिला विषयक कार्यशाला गोष्ठी संचालन
- यांग्छुखोला लघु जलविद्युत सहकारी प्रशिक्षण प्रशिक्षक तथा विनियम तयारी तालिम संचालन



## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाका साविकको लाली, राया, छिप्रा र खार्पुनाथ गा.वि.स. मिलेर २०७३ सालमा खार्पुनाथ गाउँपालिका गठन भएको हो। यो गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्दछ यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ८८०.०० वर्ग किलो मिटर रहेको छ। भौगोलिक अवस्थितिका हिसावले यो गाउँपालिका समुन्द्री सतह देखि करिब २१४० देखि ३३८० मिटर सम्म उचाईमा रहेको छ। २९°४८'३८" देखि ३०°२०'५९" उत्तरी अक्षांस र ८१°४६'४८" देखि ८२°१४'१५" पूर्वी देशान्तरमा फैलिएको छ। यो गाउँपालिका पूर्वमा चंखेली, पश्चिममा सिमकोट गाउँपालिका र बाजुरा जिल्ला, उत्तरमा चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र दक्षिणमा सर्केगाड र चंखेली गाउँपालिका रहेको छ भने गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय यस गाउँपालिकाको वडा नं ५ को याङ्चुमा रहेको छ। यस गाउँपालिकामा हिन्दु धर्मालम्बीहरूको बसोवास रहेकोले राष्ट्रिय चाडपर्वहरू दशै, तिहार, माघे संक्रान्ती चैते दशै अदि जस्ता चाडपर्वको साथै स्थानीय चाडपर्वहरू पनि मनाउने प्रचलन रहेको छ। यस गाउँपालिका मा जम्मा १२० वटा मुख्य बस्तीहरू रहेका छन् त्यसै गरी २०७० भन्दा पछिका विभिन्न मितिमा तयार गरिएका साविकको जलउपयोग गुरुयोजनाको प्रतिवेदन अनुसार यस गाउँपालिकाको कूल घरधुरी १३१९ रहेको छ। कूल घरधुरी मध्ये १७ प्रतिशत दलित घरधुरी, ७१ प्रतिशत अन्य घरधुरीहरू र बाँकी १२ प्रतिशत जनजातीहरू रहेका छन्। गाउँपालिकाको कूल भूभाग ८७८४७.९२ हेक्टर मध्ये करिब १२१८०.२९ हेक्टर अर्थात १३.८७ प्रतिशत हिस्सा वन जंगलले

अगोटेको छ । त्यसै गरि १२.०९ प्रतिशत भु भाग घाँसे मैदान, १.०९ प्रतिशत झाडी क्षेत्र रहेको छ भने खेती योग्य जमिनको हिस्सा १.९८ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा न्यायोचित , समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई अर्थिक वर्ष २०६३।०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू ( अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरण राज्यको पुनसंरचना सँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन एन २०७४ को मर्म अनुरूप अर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को अरम्भ देखि नै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भई रहेको छ ।

खार्पुनाथ गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्न को लागि मिति २०७४।०४।०५ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलिडार) , यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भए को हो । सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही अर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा किटान गरिएका लक्ष बमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू , अइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेषण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरीएको छ ।

अर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ७१ प्रतिशत रकम निकासी भै निकासीको आधारमा ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको सबै निकासी भै सबै खर्च भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रू.४३,०७,४९० परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ । स्थानीय तहको विनियोजित रू १०८,३३,६१८ मध्ये रू. ७२,१४,००० खर्च भएको छ । यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ६६% प्रतिशत तथा निकासीको आधारमा ९२% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ । तर्जुमा गरिएका २६ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये १५ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ११ वटा निर्माणधिन योजनाहरू अगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन् ।

यस प्रतिवेदनमा खार्पुनाथ गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगति तथा सम्पन्न हुन नसकेका क्रियाकलापहरू तथा अइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई / परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

## २.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जनकार्यन्वयन योजना” को कार्यन्वयन प्रगति

### २.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जलउपयोग गुरुयोजना तथा जिविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनालाई गाउँ पालिका कार्यपालिका बैठकबाट पारित गर्दै गाउँ सभाबाट अनुमोदन गर्ने काम भयो ।
- जल उपयोग गुरु योजना तथा जिविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनामा प्राथामिकतामा परेका योजना लाई योजना तर्जुमामा पहिलो प्राथामिकतामा छनोट गरिएको ।

### २.१.२. जीविकोपार्जनकार्यन्वयन योजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- अगुवा कृषक र स्थानीय स्रोत व्याक्ती लाई ३ दिने तालिम दिए पछि कृषकहरु व्यवसायिक तरकारी गर्नमा रूची देखाएका ।

## २.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- मसिना खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि १५ घरधुरीमा सफा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगुको साथै खेर गएको पानी घरबारी बगैचामा प्रयोग गरि अयअर्जनमा बृद्धि भएको छ ।
- फुक्चन खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि ७० घरधुरीले सफा स्वच्छ खानेपानीको प्रयोग गर्ने र करेसाबारीमा प्रयोग गरेका छन् ।
- कुति हिल्सा लार्के खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि २५ घरधुरीले सफा स्वच्छ खानेपानी प्रयोग गर्नुका साथै खेर गएको पानीबाट बारीमा सिंचित गरि उत्पादनमा बृद्धि भएको छ ।
- बैश्याडी दुर्पा खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि ४७ घरधुरीलाई सफा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको छ ।
- नायकवाडा खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि १०२ घरधुरीले सफा स्वच्छ खानेपानी पिउने र व्यवसायिक तरकारी खेती गरी अम्दानीमा बृद्धि भएको छ ।
- बाग्धारा खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि ३१ घरधुरि मा सफा स्वच्छ खानेपानी को पहुँच पुगेको छ ।
- ताक्ला खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि ४३ घरधुरीमा सफा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको छ ।
- मान्धारा मा.वि.खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि २ घरधुरी / १११ छात्र छात्रा

ले सफा स्वच्छ खानेपानी पिउने गरेका छन् ।

- जाकोट बहुउपयोगी योजना बाट १७ घरधुरीले सफा स्वच्छ खानेपानी पिउनुका साथै सिचाईको प्रयोग गरि अयअर्जनमा बृद्धि भएको छ ।
- खार्पुनाथ वडा नं २ थालि र वडा नं ३ राया वस्तिका ९२ घरधुरी र २ विद्यालयमा ९४ फलामे सुधारिएको चुलो वितरण गरि धुवाँबाट मुक्त भएका छन् ।

### तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	८	१९६३	८	१९६३	१००	१००
२	संस्थागत चर्पीहरु(संख्या)	८	१०१४	८	१०१४	१००	१००
३	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१५	१५९०	१५	१५९०	१००	१००
४	सुधारिएको चुल्हो	२	११५४	२	११५४	१००	१००
५	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	०	०	०	०
६	बहुउपयोगी योजना	१	९५	१		१००	१००
७	पूर्ण सरसफाई चांग जुठेलना	२	९२२	२	९२२	१००	१००

योजना						
-------	--	--	--	--	--	--

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरू

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
१	खानेपानी	मसिना खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	आ .ब २०७५/०७६ मा सम्झौता भई खानेपानीका इन्टेक १ अ. भि. टी १ र १५ वटा धाराका संरचनाहरू २०७६।०७७ मा सम्पन्न गरि १५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
२		फुक्चन खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	खार्पुनाथ १ गोक्पामा पर्ने यो योजना बाट अन्य र जनजाती गरी ७० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् भने यस खानेपानी बाट सम्पूर्ण घरधुरीले घरबारी बगैचामा सिंचत गरिरहेका छन् ।
३		कुतिहिल्सा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२०७६।०७७ मा सम्पन्न भएको यो योजनाबाट दलित र जनजाती गरी २५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । यस योजनाको संरचनामा ३ वटा इन्टेक , २ वटा अ. भि.टी र ७ वटा धारा निर्माण भएका छन् ।
४		नायकवाडा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	इन्टेक ३ , अर.भि.टि. ३ र धारा १७
५		बाग्धारा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	इन्टेक १ , डि.सि १ , अर.भि.टि. २ र धारा
६		बैश्याडी दुर्पा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	इन्टेक १ , अर.भि.टि. १ धारा
७		ताक्ला खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	इन्टेक १ अर.भि.टि. १ धारा १३
८		मान्धारा मा.वि. खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	आ .ब २०७५/०७६ मा सम्झौता भई खानेपानीका सम्पूर्ण संरचनाहरू २०७६।०७७ मा सम्पन्न गरि २ घरधुरी र विद्यालयका छात्र , छात्रा , शिक्षक र शिक्षिका लाभान्वित भएका

			छन् ।
ख १	बहुउयोगी योजना	जाकोट बहुउपयोगी योजना	यस जाकोट बहुउपयोगी योजनाबाट ६ वटा धारा अर.भी.टी १ इन्टेक १ र सिंचाइ गर्नको लागि पानी संकलन पोखरीको निर्माण भइ अयअर्जन मा बृद्धि भएको छ ।
ग १	सुधारिएको चुल्हो	सेराडिल गुम्वाधारा फलामे सुधारिएको चुल्हो योजना	९२ वटा घरधुरी र २ वटा विद्यालय मा ९४ वटा फलामे सुधारिएको चुलो वितरण भइ धुवाँ बाट मुक्त भएका छन् र दाउरा कम खपत हुने र समयको वचत हुने गरेको छ ।
घ १	संस्थागत शौचालय	मान्धारा मा.वि. शौचालय निर्माण योजना	६ कोठे शौचालय निर्माण भएको ।
२	संस्थागत शौचालय	भानुभक्त आधारभुत विधालय	३ कोठे शौचालय निर्माण भएको ।
३	संस्थागत शौचालय	मोतिराम आधारभुत विधालय	३ कोठे शौचालय निर्माण भएको ।
४	संस्थागत शौचालय	मालिका मा.वि.	३ कोठे शौचालय निर्माण भएको ।
५	संस्थागत शौचालय	शंकर मा.वि. शौचालय निर्माण योजना	३ कोठे शौचालय निर्माण भएको ।
६	संस्थागत शौचालय	जोगराज आधारभुत विधालय	३ कोठे शौचालय निर्माण भएको ।
७	संस्थागत शौचालय	श्रीमष्ठा आधारभुत विधालय	३ कोठे शौचालय निर्माण भएको ।
८	संस्थागत शौचालय	तल्ले प्यूस बाल शिक्षा	३ कोठे शौचालय निर्माण भएको ।
ङ	पूर्ण सरसफाइ	लाली चाड जुठेल्ना निर्माण योजना	१८० वटा चाड जुठेल्ना निर्माण भएको ।

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्षबमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको
---------	--	--

		लागिगाउँपालिका परियोजनाव्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	अत्याधिक मात्रामा हिमपात हुनु	बाह्य सामग्रीको खरिद ढुवानी चाँडो गर्ने
२	विश्व महामारी (कोभिड १९) फैलिनु	प्रत्येक योजना स्थलमा साबुन पानीको व्यवस्था गरिएको

### २.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- चरण बढ्द तालिमहरू संचालनबाट खानेपानी र सिचाइका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहज भएको
- अगुवा कृषक तालिमबाट कृषकहरू व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न अग्रसर भएका छन् ।
- निर्णयमा महिला कार्यशाला गोष्ठी संचालनबाट महिला जनप्रतिनिधि लैडिगक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्न गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा अपना अवाज उठाउने सम्म पुगेकी छन् ।

### तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	कुल जम्मा
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	८३	७०	५३	२४	१९२	१६९	३२८	२६३	५९१
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू	३४	१०	१०	४	१३३	३९	१७७	५३	२३०
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू	९८	७	२७	८	२४१	४९	३६६	६४	४३०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरू	०	०	०	०	२	१	२	१	३
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू	०	०	०	०	०	०	०	०	०

नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०	०
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	५	०	०	०	१०	४	१७	४	२१
<b>जम्मा:</b>	<b>२२०</b>	<b>८७</b>	<b>९२</b>	<b>३६</b>	<b>५७८</b>	<b>२६२</b>	<b>८९०</b>	<b>३८५</b>	<b>१२७५</b>
<b>प्रतिशत</b>	<b>२४</b>	<b>१०</b>	<b>६६</b>	<b>७०</b>	<b>३०</b>	<b>१००</b>			

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

### १. घरबारी:

१५ वटा घरबारी व्यवस्थापन समुह गठन भई ३७२ घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् ।

### ३. आयआर्जन:

१५ वटा घरबारी समुहमा ४५ वटा प्लाष्टिक पाल वितरण गरि मौसमी बेमौसमी तरकारीका विउ वितरण भई घर घरमा करेसाबारी संचालनमा आएका ।

### ४. सहकारी:

यांग्चुखोला लघु जलबिधुत सहकारी प्रशिक्षण प्रशिक्षक तथा विनियम तयारी तालिम संचालन

### ५.स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन:

३ जना स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन भई कार्य गरेका

## तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	४४	९२	३२१	४५७	१५	३	३४	५२	५९	९५	३५५	५०९
२	९	११	९०	११०	२	०	५७	५९	११	११	१४७	१६९
३	४७	१०१	५८	२०६	११	२०	१७	४८	५८	१२१	७५	२५४
४	२६	०	२५४	२८०	१	०	७३	७४	२७	०	३२७	३५४
५	३७	५३	७५	१६५	६९	५	६५	१३९	१०६	५८	१४०	३०४
<b>जम्मा</b>	<b>१६३</b>	<b>२५७</b>	<b>७९८</b>	<b>१२१८</b>	<b>९८</b>	<b>२८</b>	<b>२४६</b>	<b>३७२</b>	<b>२६१</b>	<b>२८५</b>	<b>१०४४</b>	<b>१५९०</b>



तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	१५	१०	३०	५५
जम्मा		१५	१०	३०	५५

तालिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम		
		देविमालिका कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	दुदेदह प्रारांगारिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या			
क	सामुदायिक संस्था	११	६	
ख	उपभोक्ता समिति	६	०	
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह	०	०	
२	शेयर धनीहरूको संख्या	२४८	२१८	
क	महिला	९९	१०४	
ख	पुरुष	१४९	११४	
३	कुल सम्पत्ती रु.	८०६६९९	१२४२१८७	
४	कुल ऋण लगानी रु	७६३२००	०	
५	असूली दर	०	०	
६	खुद नाफा रु	९१२८७	०	
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०	०	
८	जगेडा कोष रु.	०	०	
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१	०	

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
१	वाघधारा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२

खार्पुनाथ गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

२	बैस्याडी दुर्पा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
३	कृति हिल्सा लार्के खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
४	मसिना खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
५	नायकवाडा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
६	फोक्वाड. खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
७	ताक्ला खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
८	मानधारा मा.वि. खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
९	बाहुनखर्क खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
१०	जैमले खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
११	बाम्टा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
१२	लेख खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
१३	खाती गुम्वा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
१४	पानलोटी सुनाखाडा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
१५	पिनेरीखोला सिंचाई योजना	१	१	१
१६	कालामुल लेखमाभा सिंचाई योजना	१	१	१
१७	किमिथाड. सिंचाई योजना	१	१	१
१८	मईखोला सिंचाई योजना	१	१	१
१९	जाकोट बहुउपयोगि योजना	२	२	२
२०	तल्लो प्युस वाल विकास सरसफाइ योजना	२	२	२
२१	संस्थागत शौचालयहरु निर्माण	२	२	१
२२	सिता मा.वि. शौचालय निर्माण	२	२	२
२३	पुर्ण सरसफाइ (चाड. जुठेल्ना) योजना, लाली	२	२	१
२४	पुर्ण सरसफाइ (चाड. जुठेल्ना) योजना, गोप्का	२	२	१
२५	सुधारीएको फलामे चुल्हो योजना, खार्पुनाथ २,३	२	२	१
२६	सुधारीएको फलामे चुल्हो योजना, खार्पुनाथ १	२	२	२
<b>जम्मा</b>		<b>४२</b>	<b>४२</b>	<b>३८</b>

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१०	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०

३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१४	०

### तालिका ३.३: अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७७।०२।१४ देखि २०७७।०२।२५	सबै योजनाहरूमा लागत ईस्टिमेट अनुसार कार्यहरू भएको सो अनुसार निरन्तरता दिनुपर्ने	कार्यान्वयन गरिएको
२	२०७७।०३।०८ देखि २०७७।०३।०१२	सबै योजनाहरूमा लागत ईस्टिमेट अनुसार कार्यहरू भएको सो अनुसार निरन्तरता दिनुपर्ने	कार्यान्वयन गरिएको

## ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

### तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७६।०४।०३	• सहयोगी संस्था तथा गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृतको अ.व. २०७५।०७६ को मुल्यांकनका लागि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा निजले तोकेको व्यक्तिलाई तोक्रे ।
२	२०७६।०५।१६	• सहयोगी संस्था तथा गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृतको मुल्यांकन समितिको प्रतिवेदन अनुसार मिति २०७६।०४।०१ देखि २०७७ अषाढ मसान्त सम्म सम्झौता गर्ने ।
३	२०७६।०६।१८	• स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरू तथा प्राविधिक कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने ।
४	२०७६।०८।१०	• याङ्चुखोला लघु जलविद्युत योजनाको विद्युतिय सामग्रीहरू सप्लाईका लागि बोलपत्र सुचना अवहान गर्ने ।
५	२०७६।१२।१०	• अ.व. २०७६।०७७ मा हाल सम्म भएका क्रियाकलापहरूको समीक्षा
६	२०७७।०१।१५	• अ.व. २०७६।०७७ मा संचालन रहेका योजनाहरूको अनुगमन गर्ने ।
७	२०७७।२।१६	• अनुगमन पश्चात समीक्षा • २ थान भेण्डर मेशिन सरसफाइ बजेटबाट खरीद गर्ने ।
८	२०७७।०२।२२	• रु ३००००० बराबरको सरसफाइ सामग्रीहरू सरसफाइ बजेट शिर्षकबाट खर्च गर्ने ।

९	२०७७।०२।३१	• अ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक कार्यक्रम लागि संशोधन गर्ने र No objection का लागि परियोजना सहयोग इकाइ , डडेलधुरामा अनुरोध गर्ने ।
१०	२०७७।०३।०८	• आ.व. २०७७।०७८ मा संचालन गरिने योजनाहरूको छलफल ।
<b>RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक</b>		
१	२०७६।०४।२६	• मासिक कार्ययोजना अनुसार भएको प्रगति बारे छलफल
२	२०७६।०५।३०	• कर्मचारीको कार्यक्षेत्र विभाजन बारे छलफल
३	२०७६।०६।३०	• मासिक कार्ययोजना अनुसार भएको प्रगति बारे छलफल
४	२०७६।०७।२४	• मासिक कार्ययोजना अनुसार भएको प्रगति बारे छलफल
५	२०७६।०८।२९	• चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन माथि छलफल
६	२०७६।०९।२७	• मासिक कार्ययोजना अनुसार भएको प्रगति बारे छलफल
७	२०७६।१०।२९	• मासिक कार्ययोजना अनुसार भएको प्रगति बारे छलफल
८	२०७६।११।२८	• सम्पन्न हुन बाँकी रहेका योजना बारे छलफल
९	२०७७।०२।३२	• अनुगमन कार्यदलबाट अएका सुझाव माथि छलफल
१०	२०७७।०३।३१	• वार्षिक प्रतिवेदन तयार र प्रगति समिक्षा माथि छलफल

## ५. नीति तर्जुमा

खार्पुनाथ गाउँपालिकाले तपशिलमा उल्लेखित नीति , नियमावली , निर्देशिका र एनहरू तयार गरी गाउँपालिका कार्यपालिका बैठक बाट पारित गर्दै गाउँ सभा बाट अनुमोदन गर्ने काम भएको छ ।

- जल उपयोग गुरूयोजना तथा जिविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना
- स्थानीय तह सहकारी ऐन
- कृषि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन
- स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन , परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि
- मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७
- खानेपानी , सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७
- जलस्रोत ऐन २०७७
- जलस्रोत नियमावली २०७७

## ६. सहकार्य

प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयनका गर्नका लागि कसैको एकलो प्रयासले सम्भव हुदैन त्यसैले परियाजनाबाट संचालन हुने क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी रूपले संचालन गर्नका लागि

गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न शाखा , प्राविधिक सहयोग इकाई र अन्य सरोकारवाला निकाय सँग सम्पर्क समन्वय सहकार्य गर्ने काम भइरहेको छ । परियोजनाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनको लागी योजना स्थलमा गएर अनुगमन समिति , विषयगत शाखाका प्रमुख र अन्य सरोकारवाला निकाय सँग समन्वय र सहकार्य गरि पटक पटक अनुगमन गराउने गरिएको छ । यसरी हुने अनुगमनमा कार्यक्रम संचालन प्रक्रियामा अनुगमन , स्वीकृत माग अनुसारको श्रोत साधन समुदायमा पुगे नपुगेको त्यस अनुसारको काम भए नभएको जस्ता कार्यक्रम शुरू देखि त्यसले दिने अन्तिम प्रतिफल सम्मको अनुगमन भएको छ ।

### तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	स्वास्थ्य चौकी लाली	राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह	प्राविधिक	प्रविधिक सहयोग
२	स्वास्थ्य चौकी लाली	मर्यादित महनावारी स्वच्छता दिवस	प्राविधिक	प्रविधिक सहयोग

### ७. आइपरेका समस्याहरु

#### तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	अत्याधिक मात्रामा हिमपात हुनु	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ हिउ पग्लिए पछि योजनाको काम शुरूवात गरिएको</li> <li>○ नियमित रूपमा कर्मचारीबाट सहजिकरण भएको</li> </ul>
२	उपभोक्ताले जनश्रमदानमा ध्यान नदिनु	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ समय समयमा उपभोक्ताहरुको अम भेला गरी उपभोक्ता समितिलाइ परिचालन गरिएको</li> <li>○ वडा स्तरीय स्थानीय तह सँग समन्वय र सहकार्य गरिएको</li> </ul>
३	दक्ष कामदार उपलब्ध नहुनु	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ अन्य वडाका दक्ष कामदारको प्रयोग गरि योजना सम्पन्न गरिएको</li> </ul>

## अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)			(GoN+GoF+EU+RM)	
<b>खानेपानी तथा सरसफाइ योजना</b>								
वैस्याडी दुर्गा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	४,६५८,३८५.४२	३,३९५,९९९.९९	१,६९८,०००.००	५१७,०००.००	नजाने	०.००	२७८
कृति हिल्सा लार्के खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	३	४,४७१,५०६.९१	३,२२६,०००.००	१,६१३,०००.००	५००,०००.००	नजाने	०.००	१३२
मसिना खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१,७३२,१६८.१०	१,२१९,०००.००	६०९,५००.००	१६२,०००.००	नजाने	०.००	८५
नायकवाडा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	७,७२२,२१८.८३	५,५९५,०००.०१	२,७९७,५००.०१	८२०,०००.००	नजाने	०.००	६१४
फोक्वाड. खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	५,९०७,९४८.३२	४,१५८,०००.००	२,०७९,०००.००	६५०,०००.००	नजाने	०.००	४५२
ताक्ला खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	४,३५७,९८७.६१	३,१३४,०००.००	१,५६७,०००.००	४५६,०००.००	नजाने	०.००	२२९
मानधारा मा.वि. खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	४,५६७,५७९.४४	३,१८०,०००.००	१,५९०,०००.००	५९८,०००.००	नजाने	०.००	१५
बाहुनखर्क खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	४,१६०,२५७.०३	१,५३९,२९५.१०	१,५३९,२९५.१०	२४९,६१५.४२	जाने	१५३९२९५.१०	०
जैमले खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	९,१५१,९९१.५७	३,३८६,२३६.८८	३,३८६,२३६.८८	५४९,११९.५०	जाने	३३८६२३६.८८	०
बाम्टा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	६,५०२,७६४.८९	२,४०६,०२३.०१	२,४०६,०२३.०१	३९०,१६५.९०	जाने	२४०६०२३.०१	०

**खापुनाथ गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)**

लेख खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	४	६,६५७,२१७.९१	२,४६३,१७०.६३	२,४६३,१७०.६३	३९९,४३३.०८	जाने	२४६३१७०.६३	०
खाती गुम्वा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	३	२,२४५,५६९.४४	८३०,८६०.६९	८३०,८६०.६९	१३४,७३४.१७	जाने	८३०८६०.६९	०
पानलोटी सुनाखाडा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	६,६२२,५९५.०१	२,४५०,३६०.१५	२,४५०,३६०.१५	३९७,३५५.७०	जाने	२४५०३६०.१५	०
<b>जम्मा:</b>		<b>७४,७६८,३५२.५७</b>	<b>४१,२८६,९४६.४६</b>	<b>४१,२८६,९४६.४६</b>	<b>९२९,५२३.९५</b>		<b>१३,०७५,९४६.४६</b>	<b>१,९६३</b>
<b>सिँचाई / बहुपयोगी योजना</b>								
पिनेरीखोला सिँचाई योजना	५	४,४०१,९५३.२६	१,५४०,६८३.६४	१,५४०,६८३.६४	४४०,१९५.३३	जाने	१५४०६८३.६४	०
कालामुल लेखमाभा सिँचाई योजना	४	६,४४८,४३६.११	२,२५६,९५२.६४	२,२५६,९५२.६४	६४४,८४३.६१	जाने	२२५६९५२.६४	०
किमिथाड. सिँचाई योजना	३	२,९५८,०७४.१४	१,०३५,३२५.९५	१,०३५,३२५.९५	२९५,८०७.४२	जाने	१०३५३२५.९५	०
मईखोला सिँचाई योजना	१	३,६०४,२६६.००	१,२६१,४९३.१०	१,२६१,४९३.१०	३६०,४२६.६०	जाने	१२६१४९३.१०	०
जाकोट बहुउपयोगी योजना	५	४,६१४,८५२.२५	३,२९०,०००.००	१,६४५,०००.००	५५३,७८२.२७	नजाने	०.००	९५
<b>जम्मा:</b>		<b>२२,०२७,५८१.७६</b>	<b>९,३८४,४५५.३३</b>	<b>९,३८४,४५५.३३</b>	<b>२,२९५,०५५.२२</b>		<b>६,०९४,४५५.३३</b>	<b>९५</b>
<b>संस्थागत शौचालय</b>								
तल्लो प्युस वाल विकास सरसफाइ योजना	१	१,०७२,९०६.००	६७२,०००.००	६७२,०००.००	१५०,०००.००	नजाने	०.००	३०
संस्थागत शौचालयहरु निर्माण	१-५	३,४४२,४५०.१३	१,८७२,३०२.२१	१,८७२,३०२.२१	३००,०००.००	जाने	६२४१००.७४	६९४
सिता मा.वि. शौचालय निर्माण		१,४५५,९१७.४७	१,००५,०००.००	१,००५,०००.००	१८५,०००.००	नजाने	०.००	२९०
<b>जम्मा:</b>		<b>५,९७१,२७३.६०</b>	<b>३,५४९,३०२.२१</b>	<b>३,५४९,३०२.२१</b>	<b>६३५,०००.००</b>		<b>६२४,१००.७४</b>	<b>१,०१४</b>
<b>पूर्ण सरसफाइ योजना</b>								

खापुनाथ गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

पुर्ण सरसफाइ (चाड. जुठेल्ना) योजना, लाली	१	१७६८३६७.७१	८७४०००	८७४०००	३४९६१९.९८	नजाने	०.००	५११
पुर्ण सरसफाइ (चाड. जुठेल्ना) योजना, गोपका	१	१९११६६२.१६	७६४०००	७६४०००	३८२२८२.२	नजाने	०.००	४११
<b>जम्मा:</b>		<b>३६८००२९.८७</b>	<b>१६३८०००</b>	<b>१६३८०००</b>	<b>७३१९०२.२</b>		<b>०</b>	<b>९२२</b>
<b>सुधारिएको चुल्हो</b>								
सुधारिएको फलामे चुल्हो योजना, खापुनाथ २,३	२,३	१५६९३१३.९८	९९००००.००	९९००००.००	२३५०५८.४०	नजाने	०.००	८८४
सुधारिएको फलामे चुल्हो योजना, खापुनाथ १	१	१३०५४२१.१२	९४५०००.००	९४५०००.००	१९५७७१.७५	नजाने	०.००	२७०
<b>जम्मा:</b>		<b>२८७४७३५.१०</b>	<b>१९३५०००.००</b>	<b>१९३५०००.००</b>	<b>४३०८३०.१५</b>		<b>०.००</b>	<b>११५४</b>



## अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	संचालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
<b>खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम</b>										
१	योजनाहरूमा चरणवद्ध कार्यपद्धतिका तालिमहरू			६३	७१	६३	४८	२१	१६२	१३५
२	उपभोक्ता समिती व्यवस्थापन तालिम	५	३	१	६	४	३	१	११	१५
३	योजनाहरूमा निर्माण पश्चात तथा पानी सुरक्षा गोष्ठी		३	८	६	३	२	२	१९	१९
<b>सरसफाइ, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरू</b>										
१	प्याड बनाउने तथा हातधुने अभ्यास		२	२	३४	१०	१०	४	१३३	३९
<b>जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू</b>										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम		३	१५	९३	५	२५	३	२१७	२९
२	डालेचुक संकलन तथा प्रशोधन तालिम		५	१	०	०	१	३	४	२
३	अगुवा किसान तालिम		३	१	२	०	०	०	११	३
४	विद्युत सहकारीका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा विनियम तयारी तालिम		१०	२	३	२	१	२	९	१५
<b>स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरू</b>										
१	स्थानीय स्रोत व्यक्ति तालिम		३	१	०	०	०	०	२	१
<b>जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू</b>										
<b>नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू</b>										
<b>गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू</b>										
१	निर्णयमा महिला तालिम		३	१	५	०	२	०	१०	४

गाउँपालिका स्तरीय र वडा स्तरीय राष्ट्रिय दिवश										
१	दिवसहरु मनाउदा				४०	२०	४	१	१०८	११६

### अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु
१९२,७७,०००	१९२,७७,०००	१९२,७७,०००	१९२,७७,०००

### अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस बर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस बर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफियत
१९२,७७,०००	०	१९२,७७,०००	

## अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

### १. व्यवस्थित खानेपानी योजनाले गाउँमा हर्ष छायो

हुम्ला जिल्लाको सदरमुखकाम देखी ७कोष टाढा रहेको खार्पूनाथ गाउँपालिका वडा नं १ लालीमा पर्ने गोष्का,चिसामुलको वस्ती अन्य वस्तीको तुलनामादुर्गुम वस्तिको रुपमा चिनिन्छ । यस समुदायमा वसोवास गर्ने घरधुरीहरुको संख्या १५ रहेका छन भने जम्मै घरधुरीहरुका मानिसहरु क्षेत्रीजात छन । विगतको खानेपानीको अवस्थालाइ नियालेर हेर्ने हो भने यस समुदायमा वसोवास गर्ने मानिसहरु खोलाको फोहोर पानी खान वाध्य थिए यतिमात्र नभएर खोलको दुषितपानीको प्रयोले तहाँका मानिसहरुमा विभिन्न किसिमका सरुवा रोगको प्रकोले वर्षेनी सताईरहेको यस गाउँमा स्थायी रुपमा वसोवास गर्ने तेज वहादुर बुढाले बताउछन । भडापखाला,टाइफाइड जस्ता फोहोर पानीजन्य रोगको प्रकोपले यस समुदायमा रहेका वालवालिकाहरुमा ठूलो असर पारेको जानकारी बुढाले बताउछन् ।



हाल यस समुदायमा खार्पूनाथ गाउँपालिका , ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक सहयोग तथा सहयोगि संस्था स्नोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्रको सहजिकरणमा यस समुदायमा चिसामुल खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको सम्भौता गरी मिति २०७७साल जेठमा सम्पन्न भै हाल यहाँका मानिसहरुले स्वच्छ व्यवस्थित पानी खान पाएकाछन । स्वच्छ व्यवस्थित खानेपानीको प्रयोगले गर्दा यस समुदायका मानिसहरु विगतको तुलनामा भडापखाला तथा अन्य दुषित पानीजन्य रोग वाट कमी भएको यसै गाउँका जेष्ठ नागरीक मुनवा बुढाले बताउनु भएको छ । ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक रु १२९९,१२७ र जनताको रु ४२९,०४३ को लगनि गरी जम्मा रु १७२८,१७० मा सम्पन्न भएको खानेपानी योजनाले गर्दा यहाँका मानिसहरु एकदम खुसि भएका यस गाउँका बुद्धिजीवि व्यक्ति टसि विष्टले बताएकाछन । रु १७२८,१७० को लगनीमा निर्माण भएका योजनाहरुमा १ इन्टेक, १ पानी संकलन भाँडा (२घ.मि.) २ वाल मैत्रिधारा तथा १२०० मि.मुख्यपाईप लाईन रहको प्राविधिक हर्क रोकायाले बताएका छन् ।




## २. गरिवको घरमा लक्ष्मीको बास

यस विकट हुम्ला जिल्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं ४ छिप्रामा वसोवास गर्दै आएका सेर बहादुर रावलको पारिवारिक कथाव्यथा सुन्दाउनको घर दयनिय कठिन अवस्था देखिन्छ । उनको जिवनमा घर परिवारलाई गास बास कपास शिक्षा दिक्षागर्दा धौधौ भएको देखिन्छ आरामदायी आवश्यकताको त के कुरा गर्ने अनिवार्य आवश्यकतापनि टार्न गाह्ने अवस्थाभएको बताउछन् । उनीलामो समय देखि कृषि



खेतीपातीगर्दै आएको तर फलफुल र तरकारी बालीमाहिजोको परिवेशमा कहीकतै बाट पनि सहयोग नपाएको तर परम्परागत खेती अन्नबालीलाई मात्रप्रथामिकता दिने गरेको बताउछन् । तर अन्नबाली बाट कुनै पनि किसिमको आफुलाई लाभदायक नभएको बताउछन् अन्नबालीका रुपमा धान, गहुँ, कोदो, फापर, कागुनो, चिनो सिमी, जौ लगायत अन्य धेरै बालीहरु लगाइयो तर उत्पादनका हिसावका कुनैपनि मुनाफा कमाउन सकिएन उनका अनुसार पहिला देखि नै कृषि कामप्रति रुचि राख्ने भएतापनि तरकारी र फलफुल सम्बन्धी आफुलाई कुनैपनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट आवश्यक सरसल्लाह तथा विउ विजन कतैबाट सहयोग नभएको बताउछन् । विगतका दिनहरुमा बाह्रै महिना खेतबारीको माटोसंग लडिबडी गर्दा पनि छ महिना खान पुग्न गाह्ने भएको बताउछन् । भात रोटीसंग या दालमात्र या आलु चोटिको भोल संग बिहान बेलुका खाना खाइन्थ्यो । हाल आफु बुढो अवस्थामा भएपछि एउटा कृषकमुखी परियोजना ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना आयो अब मैले केही समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने मन धाराणा म माथि आयो सो परियोजनाले विभिन्न क्रियाकलापहरु गर्दै आएतापनि यस गाउँमा घरवारी व्यवस्थापन कृषि समुह गठन गर्ने समयमा म समुहको सदस्यबन्ने रहरले समुहमा सदस्यबने र सो समुहबाट ३ दिने घरवारी व्यवस्थापन तालिममा सहभागी भएपछि मैले सानो तिने घरवारी व्यवस्थापन गर्न पुगेपछि मेरो मुल्यांकन गरि परियोजना कृषि प्राविधिकले मलाई अगुवा कृषकमा छनौट गर्नु भयो र जिल्ला स्तरीय अगुवा कृषक तालिममा सहभागी भइयो । उक्त तालिमबाट मैले कृषि सम्बन्धीका धेरै ज्ञान गुणका कुरा सिकियो त्यस पछि मैले केहीगर्नु पर्छ भन्ने मनमालाग्यो सो तालिममा अन्नबाली र तरकारी बालीको तुलनागर्दा अन्नबाली भन्दा तरकारी बाली बाट छोटो समयमा छिटो र बढी आमदानी हुनेहेछ भन्ने कुरा बुझेकै सोहीअनुसार घरमागइ सके पछि घरवारी व्यवस्थापन भित्र यस परियोजना बाट उपलब्ध विउ काउली,बन्दा,प्याज,गोलभेडा र एक सेट थोपासिचाई प्लाष्टिक पाल मलाई उपलब्ध गरि दिएपछि मौसमी तथा बेमौसमी खेतीगर्न शुरु गरे त्यस पछि उत्पादन पनि निकै भएको बताउछन् हाम्रो गाउँको चालचलन अनुसार मागेर खाने समाजमा धेरै मान्छे हुन्छन तर काम गरेर खाने कमै भेटिन्छन् यसरी माग्ने र ईस्ट मित्रलाई नासोको रुपमा दिएर घर परीवारले खाएरपनि आफुलाई सो उत्पादन गरेको तरकारी बाट निकै मुनाफा भएको बताउछन् नजिकको बजार सदरमुकाम सिमकोटमा पुगाउन अलिआफु बुढो भएकाकारणले बेच विखनमा कठिनाई भएको बताउछन् । खार्पुनाथमा गाडी आएको अवस्थामा दैनिक दिन प्याज,गोलभेडा विक्रिगर्न श्रीमती र बुहारी लाई बजारमा विक्रि गर्न पठाउने बताउछन् तर विश्व महामारी (कोभिड १९) को कारणले

सदरमुकाम सिमकोट बजारमा उत्पादित बस्तु ढुवानी गर्न कठिनाइ र पुगाइ सके पनि बजारमा किन्ने ग्राहकनभएको कारणले पहिलो चरणमा उत्पादनभएको तरकारी घरमै खाने र बाँकीउत्पादीत बस्तुहरु बिक्रीगर्न नपायर रु १५०००० सम्म घाटा लागेको बताउछन् । त्यस पछि लकडाउन खुली सके पछि बजारको दरभाउबुझ्दा नेपालगञ्ज सुर्खेत बाट आएको गोलभेडाको रु ३५० र प्याजको २५० माकिन बेच भएको जानकारी पाइयो सोहीअनुसार आफ्नो उत्पादितगोलभेडा को प्रति के.जि. रु ३०० र प्याजको प्रति के.जि रु २००मा बिक्रीगर्दा बजारमा छिटो खपतभएको बताउछन् । वार्षिक रुपमा यसरी आफुले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री बाट रु.४०००००।आम्दानीहुने गरेको बताउछन् समाजमा मानिसहरु काम नगरी ठुलो फलखाने चाहना बोकेका हुन्छन् तर वास्तवमा कामगरे आफ्नो खेत बारीका सुन फल्ने बताउछन उनी तरकारी खेती र घरवारी व्यवस्थापनले आफ्नो पारिवारिक जिवनस्तरलाई उचाईमा पुगाउन सकिने बताउछन् त्यतीमात्र नभएर पैसा भन्ने कुरा होटल पसल र जागिर खाएर मात्रनभएर व्यवसायीक तरकारी खेती र घरवारी व्यवस्थापनगर्दै स्वतन्त्र रुपमा आर्थिक मुनाफा गरी गुणस्तरीय जिवन विताउन सकिन्छ हालआएर रावलका अनुसार पहिलेको आफ्नो पारिवारिक जिवनस्तर धेरै उचाइमा पुगेकोछ पहिले विहान बेलुका छाक टार्न धौ धौ भएको बताउछन् वर्तमान अवस्थामा बालबच्चालाई गास वास कपासका साथै गाउँ देखि काठमाण्डौसम्म बालबच्चालाई पढाइ लेखाइगारि सुखमय जिवन विताइ रु १ देखि २ लाख सम्म वचतगर्ने गरेको बताउछन् । पहिले आफुले आफ्नो खानलाउनको लागि धेरै सँग ऋण सापटी गरी जिवन गुजारा गरेको बताउछन् त्यतीवेला पारिवारिक अवस्था कमजोर दयनिय भएपछि सबैले आफुलाई हेर्ने दृष्टीकोण फरक थियो । यसरी कृषक मुखी परियोजना ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले उत्पादन देखि बजारसम्म अपनाउनु पर्ने विभिन्न ज्ञान सीपको विकास गरी मेरो जिवन स्तरलाई माथी उकास्न ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले अबिस्मरणी सहयोग गरेको हुदा मेरो घरपरिवारले यस परीयोजनालाई लक्ष्मीको रुपमा लिएकाछौ । त्यसैले मेरो अन्तर आत्म देखी यस परियोजनालाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाददिन चाहन्छौ यसरी वास्तविकतायथार्त खन्चुवा र उत्पादक कृषक को कस्तो हो मुल्यांकनगरि आगामी दिनमापनि कृषकहरुलाई आवश्यक सुभाब सल्लाहका साथै विभिन्न कृषि सामाग्री र विउविजनको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

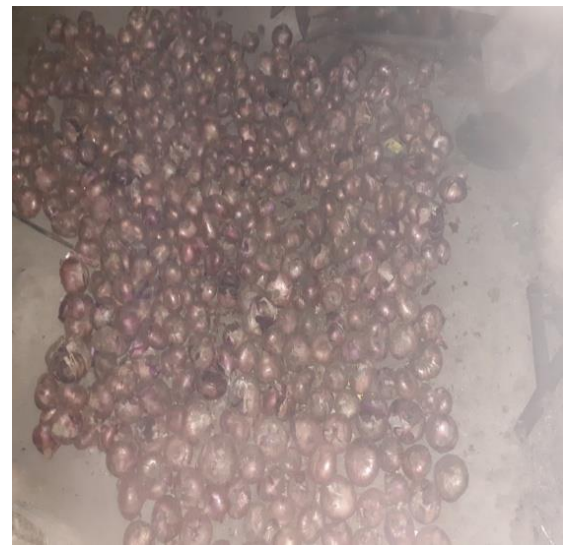

## अनुसूची ४: भिजिविलिटी

- विश्व महामारी (कोभिड १९) कोराना भाइरस लाग्नबाट बच्नको लागि जनचेतना मुलक पोष्टरहरू विभिन्न स्थानमा टाँस गरिएको ।
- जनचेतनामूलक सन्देश रेडियो बाट प्रशारण गरिएको ।
- योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पारदर्शिताको लागि सबैले देख्ने गरि सुचना पाटी टाँस गरिएको ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	ए.एम. रेडियो	बैशाख देखि आषाढ २०७७	सरसफाइसंग संबन्धित चेतनामुलक सन्देशहरू प्रसारण भएको





## अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
क.	गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:			
१	ऐन बहादुर रोकाया	खार्पुनाथ गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना हुम्ला	गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत	१२
२	तेन्जिन लामा	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना हुम्ला	प्राविधिक सहजकर्ता	९
३	बर्ख बहादुर पाल	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना हुम्ला	जीविकोपार्जन सहजकर्ता	६
ख.	सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने			
खार्पुनाथ गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, स्रोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र हुम्ला				
१	निल विक्रम शाही	स्रोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र	फिल्ड संयोजक	१२
२	देवजङ्ग हमाल	स्रोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र	फिल्ड संयोजक	१२
३	जान बहादुर छत्याल	स्रोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र	सव ईन्जिनियर	९
४	पारसा शाही	स्रोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	१२
५	जरम बहादुर शाही	स्रोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	१२
६	हर्क रोकाया	स्रोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र	जलस्रोत प्राविधिक	१२
७	हर्क बुढा	स्रोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र	जलस्रोत प्राविधिक	१२
८	नवराज शाही	स्रोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र	जलस्रोत प्राविधिक	१२

९	रतन भण्डारी	स्त्रोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र	जिविकोपार्जन प्रर्वद्धक	९
---	-------------	------------------------------------	-------------------------	---

\*\*\*
