


२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण  
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका

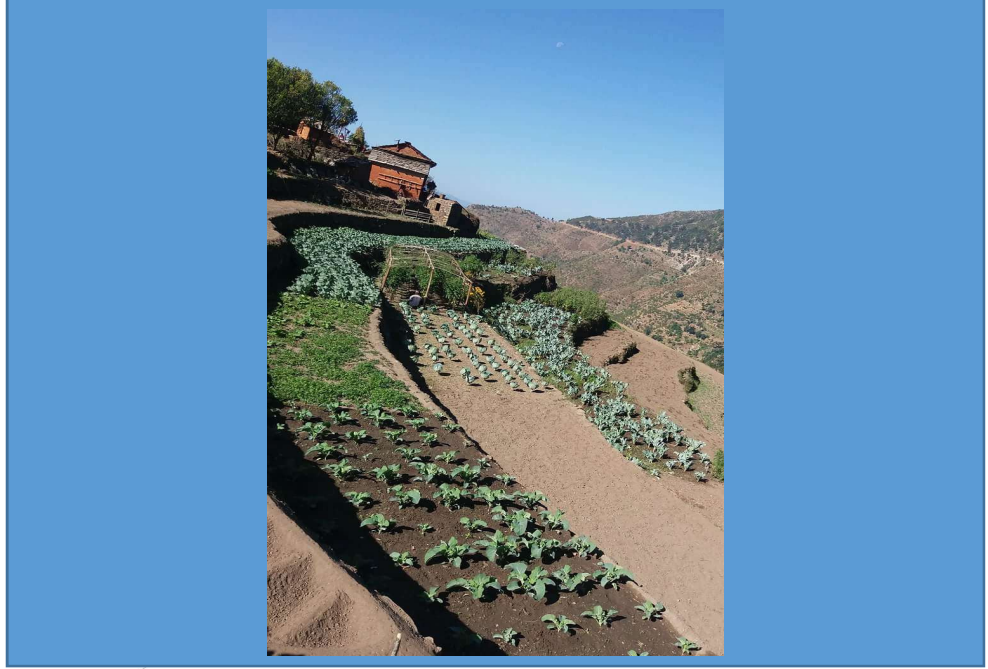

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

# प्रगति प्रतिवेदन



बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
जयगढ  
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना  
प्राविधिक सहयोग इकाई  
मंगलसैन, अछाम

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश .....	2
१. पृष्ठभूमी .....	4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी .....	5
२.१. भौतिक प्रगति .....	5
२.२. क्षमता विकास .....	6
२.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम .....	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन .....	8
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा .....	9
५. नीति तर्जुमा .....	10
६. सहकार्य .....	10
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण .....	12
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण .....	13
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण .....	15
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू .....	18
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी .....	19
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण .....	20

## तालिका सूची

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका २ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ४ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू
तालिका ९ : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन
तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य
तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

## आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	बान्नीगढी गाउँपालिका				
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण				
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 <sup>th</sup> July 2017 to 16 <sup>th</sup> July 2018)				
<b>क. आर्थिक प्रगती सारांश</b>					
परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा	पूँजीगत	९९७४	९९७४	६९९९	७६
खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	कार्यक्रम/चालु:	२५०३	२५०३	२३५७	९५
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	९९६७७	९९६७७	९२६८	
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
बजेट तथा खर्चको अवस्था	स्थानीय तह	६५६	६५६	६५६	१००
(रु हजारमा)	नेपाल सरकार	४४३२	४४३२	४४३२	१००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	६५८९	६५८९	४९८०	६३
	जम्मा	९९६७७	९९६७७	९२६८	
<b>ख. भौतिक प्रगती सारांश</b>					
नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी				
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> <li>यस आब मा ३ बटा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना सम्पन्न भइ २०९ घरधुरीका १४८० जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्। अर्थात उल्लेखित जनसंख्याले स्वच्छ खानेपानी को उपभोग गरीरहेका छन् ।</li> <li>यसै गरी सरसफाइ तथा स्वच्छता लाइ बढावा दिनको लागी विभिन्न सरसफाइ का क्रियाकलाप जस्तो चांग, जुठेला, सुधारीएको चुलो आदी क्रियाकलाप पनि गरिएका छन् । अनुसुची मा</li> </ul>				
नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन	<ul style="list-style-type: none"> <li>यस आब मा सम्पन्न माथि उल्लेखित घरधुरीले आफ्नो घरबारीमा खेर गएको पानी उपयोग गरी सिंचाइको सुविधा पाएका छन् । साथै जीविकोपार्जन सुधारको लागी विभिन्न प्रकारका तालीम ,गोष्ठी र सम्मेलन माफर्त प्रयास भएका छन् ।</li> </ul>				
नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>यस आ.व.मा सम्पन्न भएका ३ बटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना साथै आगामी वर्षमा अत्या भइ सम्पन्न हुने प्रत्येक योजनाहरुमा जलवायु परिवर्तन</li> </ul>				

	<p>अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण का लागि केही प्रयास स्वरूप स्रोत संरक्षणका कार्य, पहिरो नियन्त्रणका प्रयास, साना साना पुर्नभरणको लाइ खाल्डा, वृक्षारोपण आदी गरीएको छ । यसै गरि ३१५ बटा सुधारीएको चुलो सम्पन्न ।</p>
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● यस आव मा बान्नीगढी गा.पा मा ४ बटा घरबारी व्यवस्थापन समुहलाई तालीम दिइएको छ जसबाट ६४८ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन । अर्थात उल्लेखित १०८ घरधुरीले आफ्नो घरबारीमा खेर गएको पानीको माध्यमबाट सिंचाइ गरी जिवीकोपार्जनका क्रियाकलाप गरीआएका छन ।</li> <li>● योजनालाई सुचारु रुपमा संचालन गर्नको लागि अर्थात योजनाको दिगोपनको लागि योजना को उपभोक्ता समिति गठन लगतै उपभोक्ता समिति लाइ तयारी चरणका विभिन्न तालीम, योजना कार्यान्वयनको चरणमा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक पर्ने तालीम साथै योजना सम्पन्न भए पछि को अबधिमा पनि विभिन्न दिगोपन को लागि आवश्यक तालीमको माध्यमबाट जम्मा महिला ७३१ र पुरुस ४३३ गरी कुल जम्मा ११६४ को क्षमता विकास विकास भएको छ ।</li> <li>● सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन को लागि गा.पा को सहयोगमा विभिन्न चरणमा विभिन्न महिला समुहहरूलाई सहभागी गराइ तालीम तथा उनीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गरीयो ।</li> <li>● जिवीकोपार्जन विकाससंग सम्बन्धित तालीमबाट जम्मा २४ जना ले बहुउद्देशीय नर्सरी , च्याउ उत्पादन तालीम आदी</li> </ul>

## आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखि नै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ साउन २८ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको चालु तर्फको रकम १४५४३७ र दातृ निकाय तर्फको चालु तर्फ रु २२६३१००.७५ अर्को वर्षमा अल्या भएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये सम्पूर्ण खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा १००.०% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ७ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ४ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ३ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

### २.१. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. यस आव मा ३ बटा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना सम्पन्न भइ २०९ घरधुरीका १४८० जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्। अर्थात उल्लेखित जनसंख्याले स्वच्छ खानेपानी को उपभोग गरीरहेका छन ।

२. यस आव मा बान्नीगढी गा.पामा ४ बटा घरबारी व्यवस्थापन समुहलाई तालीम दिइएको छ जसबाट ६४८ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन । अर्थात उल्लेखित १०८ घरधुरीले आफ्नो घरबारीमा खेर गएको पानीको माध्यामबाट सिंचाइ गरी जिबीकोपार्जनका क्रियाकलाप गरीआएका छन ।

३. यस आ.व.मा सुधारीएको चुलोको ३१५ सम्पन्न भएका छन ।



तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	३	१४८०	३	१४८०	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु						
३	संस्थागत चर्पीहरु						
४	घरबारी व्यवस्थापन	४	६४८	४	६४८	१००	१००
५	सुधारीएको चुल्हो	१	२१३७	१	२१३७	१००	१००
६	सुधारीएको पानी घट्ट						
७	.....						
८	.....						

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
---------	---	---

१	खानेपानी योजनाको हकमा सप्लायर्सले समयमा नै सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा योजना समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नु साथै सहयोगी संस्थाका कर्मचारी को फेरबदल हुनु पनि मुख्य कारण रहेको छ ।	यसको लागि आगामी आ.ब मा सप्लायर्सको स्टोर अनुगमन गरी मात्र कार्य गराउने रणनीति लिइएको छ ।
---	--	--

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरूको सूची अनुसूची १ मा दिइएको छ ।

## २.२. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. योजनालाई सुचारु रूपमा संचालन गर्नको लागि अर्थात योजनाको दिगोपनको लागि योजना को उपभोक्ता समिति गठन लगत्तै उपभोक्ता समिति लाई तयारी चरणका विभिन्न तालीम, योजना कार्यान्वयनको चरणमा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक पर्ने तालीम साथै योजना सम्पन्न भए पछि को अवधिमा पनि विभिन्न दिगोपन को लागि आवश्यक तालीमको माध्यमबाट जम्मा महिला ७३१ र पुरुस ४३३ गरी कुल जम्मा ११६४ को क्षमता विकास विकास भएको छ ।



२. सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन को लागि बडा न ६ मा गा.पा को आर्थिक सहयोगमा विभिन्न चरणमा विभिन्न महिला समूहहरूलाई सहभागी गराइ तालीम तथा उनीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गरीयो ।

३. जिवीकोपार्जन विकाससंग सम्बन्धित तालीमबाट जम्मा २४ जना ले बहुउदेशीय नर्सरी , अगुवा किसान तालीम आदी

### तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	१७७	८८	०	०	५५४	३४५	७३१	४३३
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू								
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू	६	६			४	८	१०	१४
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरू								
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू								

नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु									
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु									
<b>जम्मा</b>									

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

### २.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

#### १. घरबारी

बान्नीगढी गाउँपालिकामा परियोजना संचालित बडामा यस अविधि सम्ममा जम्मा ३१७ घरधुरीका जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । जस मध्ये ७३ जना दलित र २४४ जना अन्य समुदायबाट लाभान्वित भएका छन् ।

#### २. आयआर्जन

बान्नीगढी गाउँपालिकामा परियोजना संचालित बडामा यस अविधि सम्ममा जम्मा २९ घरधुरीका जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । जस मध्ये ९ जना दलित र २० जना अन्य समुदायबाट लाभान्वित भएका छन् । उक्त घरधुरीमा व्यवसायिक रुपमा जिबीकोपार्जनका क्रियाकलाप अगाडी बढेका छन्

#### ३. सहकारी

बान्नीगढी गाउँपालिकामा परियोजना संचालित बडामा संचालित दर्ना कृषि सहकारी संस्थामा परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न २ वटा योजनहरु आवद् भएका छन् । कुल सम्पति २४,९५,०४४ पुगोको सहकारीमा शेयर धनीको संख्या ४७३ पुगोको छ भने सञ्चालन आत्मनिर्भरता १५८ रहेको छ ।

#### ४. लघु उद्यम आदि

#### ५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन

#### तालिका ४ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
३	३९	०	१७०	२०९	३४		७४	१०८	७३	०	२४४	३१७
<b>जम्मा</b>												

#### तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	९	०	२०	२९
२	व्यवसायिक फलफूल खेती				



३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन				
५	एग्रोभेट				
६	.....				
<b>जम्मा</b>					

**तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण**

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम	
		दर्ना कृषि सहकारी सस्था	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	२	
२	शेयर धनीहरूको संख्या	४७३	
३	कुल सम्पत्ती रु.	२४१५०४४	
४	कुल ऋण लगानी रु	१५१९०००	
५	असुली दर	८०	
६	खुद नाफा रु	१०९२१६	
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०	
८	जगेडा कोष रु.	८०१५५	
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१५८	

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

**३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन**

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने)

**तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण**

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम अनुगमन गर्नुपर्ने संख्या	कार्यपद्धति स्थलगत गरिएको संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	जडापानी खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	४	४	४
२	वासुधारा खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	४	४	४
३	बास्तोला सिल्कीधारा खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	४	२	२
४	भम्कोपानी खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	४	२	२

५	छडि चिनिखोला खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	२	२
६	थेप्चे खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	४	४	४
	जम्मा			

**तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू**

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन ( फाँटबारी)	१२	१२	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा	१६	१६	

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

**तालिका ९ : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन**

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	विभिन्न मिति	संचालीत योजनाहरूको सम्झौता अबधिमा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने	
२		निर्माण सामाग्री को उचित भण्डारण गर्नु पर्ने	उक्त सुझाव मार्फत विभिन्न योजनामा स्टोर व्यवस्थापन भएको
३		सरसफाइ र स्वच्छता को अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा योजना संचालीत स्थानमा बढाउनुपर्ने	अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सुझाव अनुसार कार्यदल बनाएको

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मा प्रकाशित गरिएको छ ।

**४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा**

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

**तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक**

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४ साउन २५ गते	● समक्षदारी पत्रमा हस्ताक्षर

२	२०७४ भदौ	<ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजनाको समिति गठन</li> <li>स्वामिन्व लिने</li> <li>गाउँसभामा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा</li> <li>कार्यक्रम वार्षिक योजना अनुसार सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा</li> </ul>
३	२०७४ कार्तिक	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा</li> <li>प्रगती समिक्षा</li> </ul>
४	२०७५ असार	<ul style="list-style-type: none"> <li>सहयोगी संस्था र कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद</li> <li>वार्षिक प्रगती समीक्षा</li> <li>जलस्रोत प्राविधिकको ३ महिनाको करार नियुक्ती</li> </ul>

## ५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न वमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

- आगामी ५ वर्षको अवधिमा गाउँपालिका का सबै वडा हरुमा सफा र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति तर्जुमा गरेको छ।
- पुर्णसरसफाइलाई जोड दिई आवश्यक रणनीति बनाइ अगाडी बढने सोच तयार भएको छ।
- छाउपठी प्रथा अन्तका लागी प्रत्येक वडाहरुमा उपयुक्त किसिमका कार्यक्रम संचालन गर्ने साथै यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने नीति लिइएको छ ।
- जीविकोपार्जन प्रवर्द्धनको लागी प्रत्येक वडामा पकेट क्षेत्र तयार गरी कृषिका कार्यक्रम अगाडी बढाउने योजना रहेको छ ।

## ६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदार निकायहरुबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

**तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृषाकलापहरुमा सहकार्य**

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)

## ७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

**तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु**

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१.	खानेपानी योजनाको हकमा सप्लायर्सले समयमा नै सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा योजना समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नु साथै सहयोगी संस्थाका कर्मचारी को फेरबदल हुनु पनि मुख्य कारण रहेको छ ।	यसको लागि आगामी आ.ब मा सप्लायर्सको स्टोर अनुगमन गरी मात्र कार्य गराउने रणनीति लिइएको छ ।

**अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण**

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
जडापानी खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	६	२,२४२,१८४	१,४१०,०९३	७१४८४६				३५५
वासुधारा खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	६	१,४८१,७६३	१,०५२,५७२	३१४१०७	१४८१७			४८१
बास्तोला सिल्कीधारा खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	६	१,४४६,६१२		८८०९९२		१	५७००००	
भम्कोपानी खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	६	३,१३०,६८७		२२४२०४०		१	८८५०००	
छाडि चिनिखोला खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	६	२,९४२,६८९		१८७३२२८		१	१०६९०००	
थेप्चे खा.पा.तथा सरसफाइ योजना	६	१,६३६,४६५	१,०२६,८२७	५५०८६९।२५				६४४
सुधारिएको चल्हो निर्माण	६	२००,०००		१७००००				

(स्रोत: scheme card डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

**अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण**

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	योजनाको प्लानिङ स्तरका तालीम	३	१ दिने	२७	६७	५९	०	०	२४९	२४४
२	योजना कार्यान्वयन स्तरका तालीम	३	१ दिने	२	७	४	०	०	४४	४३
३	निर्माण प्रशाचतका तालीम	३	३ दिने	१५	१०३	२५	०	०	२६१	५८
	जम्मा			४४	१७७	८८	०	०	५५४	३४५
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१.	महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालीम	४	३ दिने	४	डाटा					
२.	महिनावारी र स्वच्छता सम्बन्धी सम्मेलन		३ दिने	१						
	जम्मा			५						
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१.	उपभोक्ता सम्बन्धि व्यवस्थापन तालीम		२ दिने	१	४	५			२	५
२	अगुवा किसान तालीम			१	२	१			१	२
३	बहुउद्देशीय नर्सरी तालीम			१					१	१
	जम्मा				६	६			४	८
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										

१.	व्यवस्थापन सम्बन्धि बैठक र तालीम													
	जम्मा													

अनुसूची ३ : यस आ.व.मा सरसफाइको अबस्था

S.N.	VDC	Number of Total Households in VDC (According to WUMP)	VDC declared ODF ? Yes/No	Number of households having water sealed toilets	Number of Households having pit/temporary toilets	If no, how many households are not using toilet during menstruating time ?	If no, how many households' female are not using water tap during menstruating period ?	Number of HHs having proper hand washing place (available: soap & water) & practicing	Total Household having ICS	Households practicing POU	HHs practicing safe food intake (Nos of HHs)	HHs having good quality changes (Nos of HHs)	HHs having dish washing platform (nos of HHs)	HHs having garbage pit for solid waste disposal (nos of HHs)	HHs having farmyard manure (nos of HHs)
4	Bannegadi,Jaigad RM -6	860	Yes	762	3	321	335	385	242	205	860	403	369	205	205

अनुसूची ४ : यस आ.व.मा गा.पा मा स्कुल सरसफाइको अबस्था

S.N.	RM	Number of primary school (up to 8 grade)	Number of secondary school ( 8-12 grade)	Number of Students (Girls)	Number of Student (Boys)	Total Number of Students	Number of school having functional water facilities	Number of school having safe drinking water (practicing POU)	Number of schools having water tap inside the toilet	Number of schools having functional toilet facilities	Schools having sufficient number of toilet (1:50 student) cabin & urinal.	Number of school having gender friendly toilet (seceondary school)	Number of Schools having separate cabins for boys and girls (primary school)	Number of School having MHM facilities
3	Bannegadi,Jaigad RM -6	6	2	781	739	1520	6	0	0	8	0	8	8	1

## अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : दर्ना कृषि सहकारी संस्था लि दर्ना

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	२३	२३	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या	२	२	
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	.....	संख्या			
ख	.....	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	३७१		
२	पुरुष सदस्य	संख्या	१०२		

ग. जातियताको आधारमा

१	दलित	संख्या	११३		
	जनजाति	संख्या			
	अन्य	संख्या	३६०		

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	५६०८००		
२	निक्षेप (वचत)	रु.	८०४८८४		
३	जगेडा कोष	रु.	८०१५५		वार्षिक रुपमा मात्र



४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.	१०९,२१६		
६	कुल सम्पति	रु.	२४१५०४४		सन्तुलन परीक्षणवाट

### ३. पूँजी परिचालन ( प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.	८०००००		
२	पशुपालन	रु.	३५००००		
३	व्यापार	रु.	१५००००		
४	वैदेशिक रोजगार	रु.			
५	अन्य	रु.	२१९००००		
कुल जम्मा		रु.	१५१९०००		

नगद मौज्जात रु .६६४०८७

वैक मौज्जात रु.४६०४

### ४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.	८९४४००		
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	९६२२६		
३	अन्य आम्दानी	रु.	२०२४०१		
४	पाउनु पर्ने व्याज बाँकी	रु.	५६५७२		
५	भाखा नाघेको रकम	रु.	६००००		
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	११२४०००		
७	असूली दर	प्रतिशत	८०		सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	२९८६२७		
८	संचालन खर्च	रु.	१५५१९३		

९	व्याज खर्च	रु.	२९२२४		
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.	४९९४		वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.	१८९४११		
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	१०९२१६		
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत	१५८		सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सहकारी व्यवस्थापन	१३			
२	लेखा सम्बन्धी	१३			
३	लेखा पुर्नताजगी	१३			

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र. सं.	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	६	५	२		९	११
२	लेखा समिति	१	२			३	३
३	कर्मचारीहरु	१	१	१		१	२

(८) सम्बन्ध र सर्म्पक विकास:

निकाय \_\_\_\_\_

के काम \_\_\_\_\_

उपलब्धि \_\_\_\_\_

## अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

## अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	फाल्गुन २०७४ बाट	छापा माध्यमको सहयोगमा सरसफाइ सम्बन्धि सन्देश प्रकाशित
२	रेडियो	फाल्गुन २०७४ बाट	विभिन्न सरसफाइ , व्यवहार परिवर्तन, छाउपडी प्रथा , पोषण सम्बन्धि सन्देश मुलक प्रचार प्रसार : रेडियो बाट प्रसारण
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल	वर्षभरी	सामाजिक संजालबाट परियोजनाले गरेका क्रियाकलापको जानकारी
५	प्रदर्शनी	फाल्गुन २०७४	गाउँपालिकाको सहयोग र परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा कृषि मेला प्रदर्शनी
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरू		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरू		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

## अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	कर्ण के.सी	ग्रा.ज.व्य.परियोजना	जलस्रोत सल्लाहकार	
२	नरेन्द्र बिष्ट	ग्रा.ज.व्य.परियोजना	प्राविधिक सहजकर्ता	
३	फर्शुराम घिमीरे	ग्रा.ज.व्य.परियोजना	जलस्रोत प्राविधिक	
४	हरि खड्का	ग्रा.ज.व्य.परियोजना	जलस्रोत प्राविधिक	
५	तेज प्रसाद ढुंगाना	आस्था नेपाल	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
७	रमेश बि.क.	आस्था नेपाल	जलस्रोत प्राविधिक	१२ महिना
९	पुष्पा जैसी	आस्था नेपाल	स्वास्थ्य प्रवर्द्धक	१२ महिना
१४	लोकेन्द्र रावल	आस्था नेपाल	ओभरसियर	२ महिना
१५	सर्जन शाही	आस्था नेपाल	जलस्रोत प्राविधिक	९ महिना
